ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Утверждено:
Директор МКУ «Управление городского хозяйства» «16» 12 2025 г.
Р.В. Царев

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Рабочие» по ул. 7-я Рабочая в границах домовладений №49, №51, №53 г. Южа».

3. Проект предусматривает устройство спортивной площадки с установкой спортивных элементов и малых архитектурных форм на общественной территории ТОС «Рабочие».

4. Инициатор проекта: ТОС «Рабочие», председатель ТОС – Корышев Д.А..

5. Общая стоимость реализации инициативного проекта составляет 1 176 470,00 руб. Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования:

- средства областного бюджета (85%) - 999 999,50 руб.;
- средства местного бюджета (13%) - 152 941,10 руб.;
- средства юридических лиц и (или) ИП (1%) - 11 764,70 руб.;
- средства инициативной группы граждан (1%) - 11 764,70 руб.

6. Заказчиком в лице МКУ «Управление городского хозяйства» заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ПК «21ВЕК» (ООО «ПК «21ВЕК»), г. Иваново, пер. Мархлевского, д. 17, оф. 313, на выполнение работ по благоустройству общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Рабочие» по ул. 7-я Рабочая в границах домовладений № 49, № 51, № 53 г. Южа (вне рамок капитального ремонта и капитального строительства).

7. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 10.11.2025 г. по 30.11.2025 г.

8. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован 28.11.2025 года.

8.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: не нарушен.

8.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____-_____.

9. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта – 180 человек. Количество граждан, принявших имущественное участие в реализации проекта – 320 человек.

10. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта: гражданами выполнялись работы по уборке строительного мусора, образующегося в результате работы, а также по прокопке ливневой канавы вдоль площадки с целью отвода воды. Проведены субботники и общественный контроль за ходом реализации проекта.

11. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: подвоз песка, выравнивание земельного участка, уборка прилегающей территории, покос травы, вывоз мусора, предоставление техники.

12. Софинансирование инициативного проекта составило:

Наименование мероприятия (проекта)[1]	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб.	В том числе, руб.			
		Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта	Средства Субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2024 году	Объем инициативных платежей, руб.[2]	
				Объем софинансирования за счет средств граждан, поддержавших проект	Объем инициативных платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект (при наличии)
Расход на «Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г.Южа»	989 000,00	128 570,00	840 650,00	9 890,00	9 890,00

[1] Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Мероприятие соответствует по наименованию и содержанию проекту, прошедшему конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п.

[2] Объем инициативных платежей, составляющих не менее 1% от стоимости проекта

Экономия составила	187 470,00	24 371,10	159 349,50	1 874,70	1 874,70

13. Фотоматериалы

Фотографии территории до реализации инициативного проекта	Фотографии территории после реализации инициативного проекта
	
	
	

14. Скриншоты сайтов, отражающие:
- этапы строительства площадки;
- участие граждан и юридических лиц в реализации инициативного проекта;
- осуществление общественного контроля.

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_19049
https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_19083

Администрация Южского муниципального района



В Юже продолжается реализация инициативных проектов

📍Сегодня, 20 ноября, подрядная организация приступила к выполнению работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Рабочие» по ул. 7-я Рабочая в границах домовладений №49, №51, №53 г. Южа».

✅В рамках первого этапа проведены работы по планировке территории и устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка.

👍Данный проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для активного отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.

📌Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Участие в ней позволяет активным жителям самим определять, какие дворовые или общественные территории благоустроить.

Администрация Южского муниципального района



В ТОС «Рабочие» проводятся работы по устройству спортивной площадки

👍В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по монтажу спортивного оборудования, навеса с комплектом тренажеров и установке бортовых камней по периметру спортивной площадки.

Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Благодаря участию в данной программе на территории района уже реализовано более 50 проектов.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы

Оценили 39 человек

Лайк 3 26 ноя

https://ok.ru/yuzhaadm/topic/158709402127657
https://ok.ru/yuzhaadm/topic/158719855250729

Администрация Южского муниципального района
20 ноя · Администрация Южа

В Юже продолжается реализация инициативных проектов

📍Сегодня, 20 ноября, подрядная организация приступила к выполнению работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Рабочие» по ул. 7-я Рабочая в границах домовладений №49, №51, №53 г. Южа».

✅В рамках первого этапа проведены работы по планировке территории и устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка.

👍Данный проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для активного отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.

📌Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Участие в ней позволяет активным жителям самим определять, какие дворовые или общественные территории благоустроить.

Фото: ТОС "Рабочие"

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы

Администрация Южского муниципального района
26 ноя · Администрация Южа

В ТОС «Рабочие» проводятся работы по устройству спортивной площадки

👍В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по монтажу спортивного оборудования, навеса с комплектом тренажеров и установке бортовых камней по периметру спортивной площадки.

Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Благодаря участию в данной программе на территории района уже реализовано более 50 проектов.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы



https://yuzha.ru/news/news13496.html
https://yuzha.ru/news/news13506.html

В Юже продолжается реализация инициативных проектов

20-11-25



Сегодня, 20 ноября, подрядная организация приступила к выполнению работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки на территории ТОС «Рабочие» по ул. 7-я Рабочая в границах домовладений №49, №51, №53 г. Южа».

В рамках первого этапа проведены работы по планировке территории и устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка.

Данный проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для активного отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.

Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Участие в ней позволяет активным жителям самим определять, какие дворовые или общественные территории благоустроить.

Фото: ТОС "Рабочие"

В ТОС «Рабочие» проводятся работы по устройству спортивной площадки

26-11-25



В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по монтажу спортивного оборудования, навеса с комплектом тренажеров и установке бортовых камней по периметру спортивной площадки.

Напомним, программа «Местные инициативы» стартовала по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в 2019 году. Благодаря участию в данной программе на территории района уже реализовано более 50 проектов.



https://t.me/admyuzha/13711
https://t.me/admyuzha/13743





https://vk.com/public220986866?w=wall-220986866_636
https://vk.com/public220986866?w=wall-220986866_647
https://vk.com/public220986866?w=wall-220986866_663
https://vk.com/public220986866?w=wall-220986866_665
https://vk.com/public220986866?w=wall-220986866_674

ТОС "Рабочие"



Всем доброго времени суток! Как вы уже наверное знаете сегодня пришла радостная новость- спортивную площадку, проект которой мы подавали как инициативный проект от ТОС "Рабочие" в октябре 2024 года, нам все таки построят! В связи с чем, для того что бы внести необходимый 1 процент от стоимости площадки в общую сумму, мы собирали денежные средства. Ниже приведу всех, кто пожертвовал деньги, а так же отчитаюсь о расходах и остатке.

ТОС "Рабочие"

Наша спортивная площадка вошла в число данных проектов, которые в последний момент получили возможность к реализации! Сегодня я уже перевел собранные денежные средства, так же денежные средства перевела семья Силантьевых (так же 1 процент от стоимости как поддержка от ИП), за что им огромное спасибо, как и тем, кто помогал с софинансированием нашего проекта! Очередная победа- это очень радостная новость! Всем активистам продолжать в том же духе - и у нас все получится!

Департамент внутренней политики Ивановской обл.



⚡ Ещё 10 проектов вошли в число победителей программы «Местные инициативы» этого года

Это стало возможным благодаря образовавшейся экономии по итогам заключения муниципальных контрактов. В общей сложности в 2025 году по программе «Местные инициативы» благоустроят 264 территории.

Дополнительные проекты реализуют в разных муниципалитетах Ивановской области. По одному – в Кохме, Вичуге, Южском и Приволжском районах, два – в Вичугском районе и сразу четыре – в Шуе.

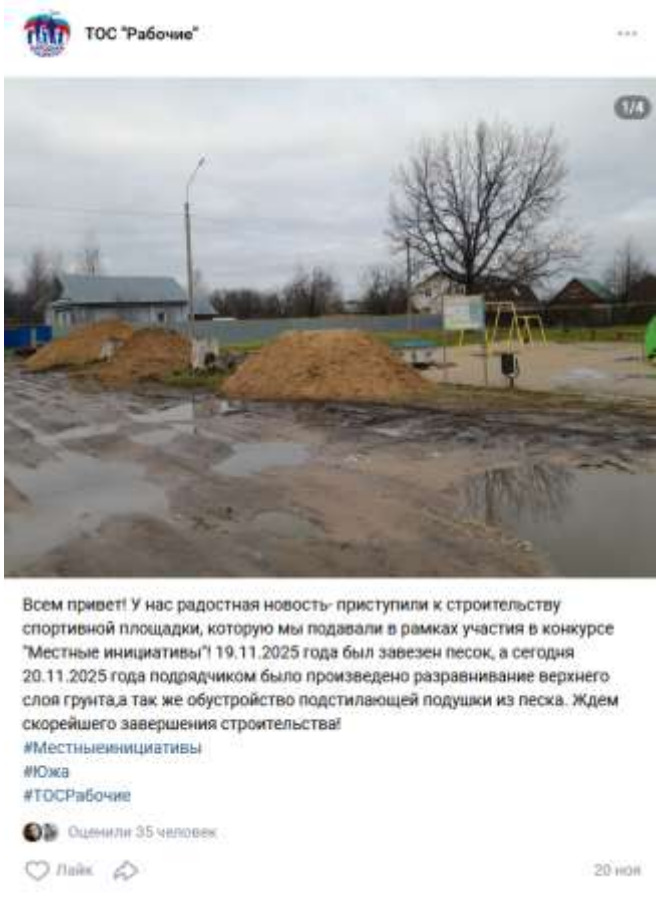



Всем добрый вечер! Сегодня с утра выкладывал опросы по поводу того, нанимать нам трактор что бы прокопать канаву и разравнять территорию около площадки, или сделать все самим. По результатам голосования около 15 человек отписались единогласно, что нужно нанять трактор. В связи с этим мной был нанят трактор, который приехал и сделал возможные мероприятия. К сожалению прокопать канаву за площадками (которая у нас есть, но очень маленькая) не удалось, так как пока на участке очень сыро, а учитывая вес трактора около 9 тонн, то он сразу стал проваливаться, поэтому данная работа пока откладывается на неопределенный срок (до того как земля подмерзнет, что бы имела способность выдержать большой вес). Прокопать канавку между площадками тоже не удалось, так как ширины для трактора не хватает, поэтому небольшую канавку придется там прокопать руками. Зато получилось прокопать большую канаву, каторая разделила дорогу от площадок, поэтому вода с дороги теперь точно никак не сможет попасть на площадки, что очень хорошо! (Так же учитывая, что тракторист постарался хорошо, сделав ее глубокой, можно будет отвести лишнюю воду от самих площадок в эту ливневку, что бы вода на них не застаивалась). Естественно, нужны будут руки что бы немножечко все подравнять лопаткой, граблями, но самое главное - канава есть, уже хорошо (кстати говоря копалось очень сложно, так как попадалось большое количество корней от спиленных ранее тополей, в ручную мы бы точно так не смогли и за неделю копки), поэтому я пятницу примерно в 18 часов пойду этим заниматься, кто хочет присоединиться буду рад видеть! (если погода не позволит то в субботу (по времени определимся ближе к делу). Канава получилась большая и длинная, решили проковать ее от дома 47 и вплоть до прогона (конечно уклон у нас в другую сторону, но так как после 47 дома еще 3 участка заброшенных и канав там нет, копать в ту сторону было бы намного дольше и затратнее (плюс ко всему там деревья и кустарники, которые нужно предварительно срезать и куда то деть, а это дополнительные расходы, но этот вопрос так же будет прорабатываться, посмотрим что можно будет сделать). Надеюсь с помощью канавы участок получится немного осушить. Тракторист трудился 2 часа, поэтому учитывая стоимость работ за 1 час, я перевел за работу 4800 рублей (чек прикладываю к посту). Напоминаю, что на софинансирование площадки, еще в 2024 году были собраны денежные средства в размере 15 250 рублей (общими усилиями). Из этой суммы я перевел один процент за стоимость построенной нам спортивной площадки (12 117 рублей 64 копейки, из них 11764 рубля 70 копеек в счет финансирования и 352 рубля 94 копейки комиссия, чек так же прикладываю к посту), итого от собранной суммы у нас оставалось 3 132 рубля 36 копеек, добавив в которые свои деньги я и перевел за копку канавы. Работ по облагораживанию общественной территории еще будет
